


N. ord.	Cod.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.	
1	A	ISTALLAZIONE CANTIERE	07/02/2016	19/02/2016	12	
2	B	TRATTO 1-2	OPERE PREVENTIVE: ripulitura e regimentazione acque piovane	14/02/2016	05/03/2016	20
3			OPERE STRUTTURALI E FINITURA CONNESSA: consolidamento murature e Porte, inserimento tiranti, intonaci, tinteggiature	09/03/2016	28/04/2016	50
4	C	TRATTO 3	OPERE PREVENTIVE: ripulitura e regimentazione acque piovane	28/04/2016	18/05/2016	20
5			OPERE STRUTTURALI E FINITURA CONNESSA: consolidamento murature, inserimento tiranti, intonaci	17/05/2016	06/07/2016	50
6	D	TRATTO 4	OPERE PREVENTIVE: ripulitura e regimentazione acque piovane	07/07/2016	22/07/2016	15
7			OPERE STRUTTURALI E FINITURA CONNESSA: consolidamento murature, inserimento tiranti, intonaci, sostituzione discendenti e pluviali	20/07/2016	18/09/2016	60
8	E	TRATTO 6	OPERE PREVENTIVE: ripulitura e regimentazione acque piovane	20/09/2016	09/11/2016	50
9			OPERE STRUTTURALI E FINITURA CONNESSA: consolidamento murature e volte, inserimento tiranti, stilatura della facciavista	09/11/2016	09/12/2016	30
10	F	TRATTO 7-8	OPERE PREVENTIVE: ripulitura e regimentazione acque piovane	21/12/2016	05/01/2017	15
11			OPERE STRUTTURALI E FINITURA CONNESSA: consolidamento murature	06/01/2017	25/02/2017	50
8	G	SMOBILIZZAZIONE DEL CANTIERE	25/02/2017	17/03/2017	20	

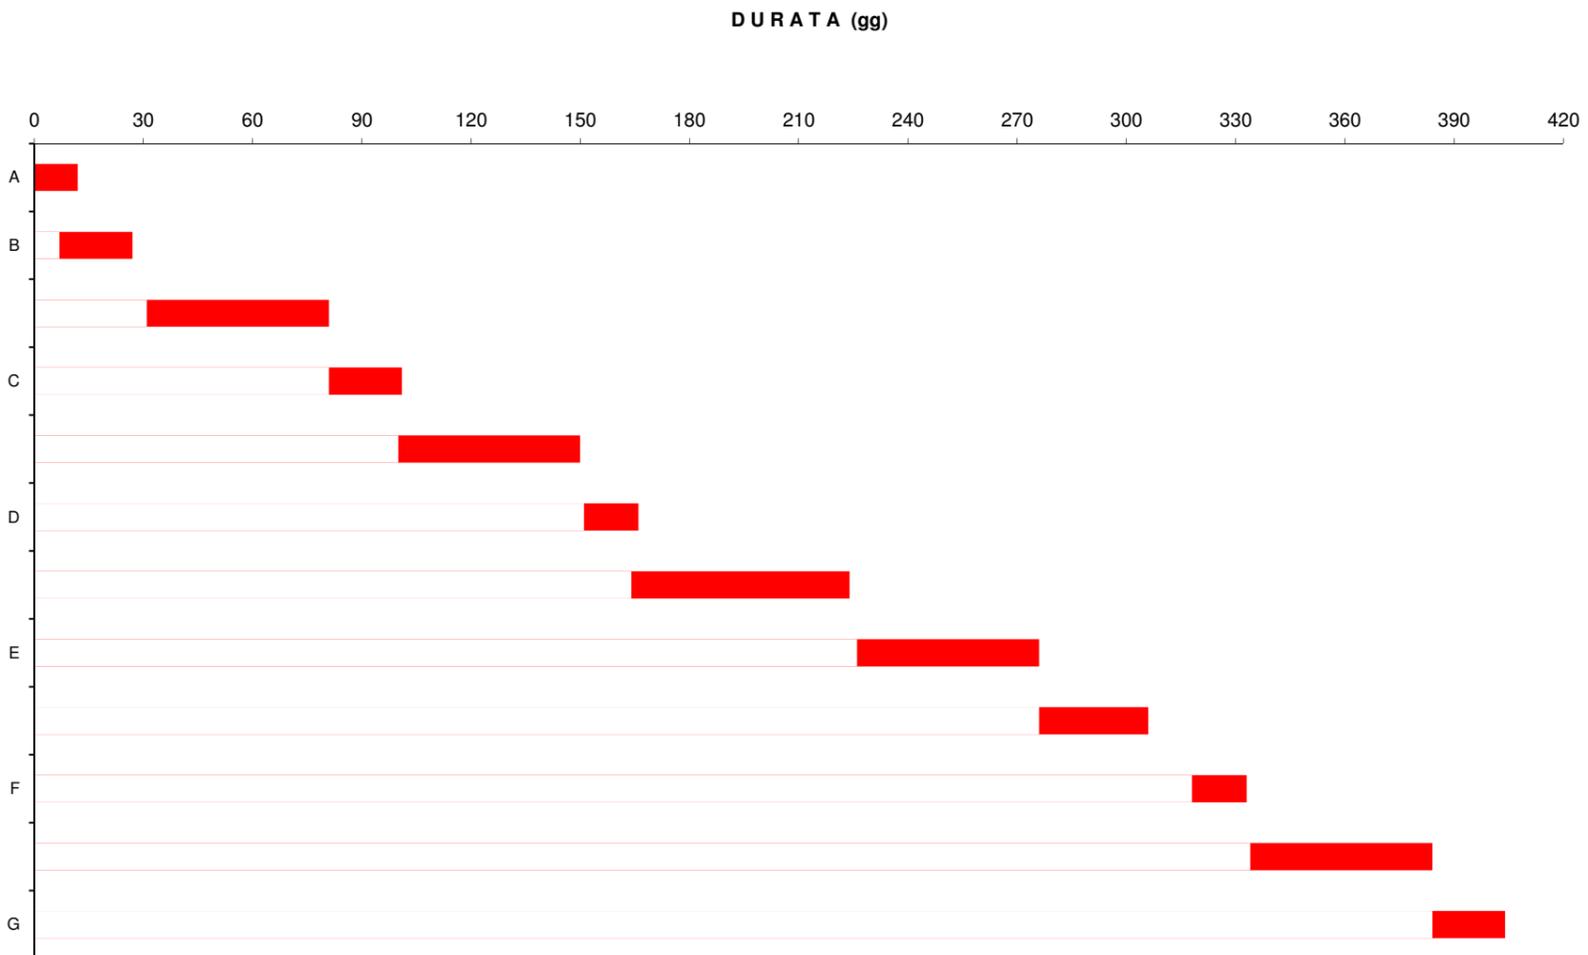

392

Inizio dei lavori

07/02/2016 gg

LE DATE DI INIZIO E FINE SONO PURAMENTE INDICATIVE

Fine lavori

17/03/2017 gg

TC 392 gg.
naturali consecutivi
